

SMLOUVA O DÍLO

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. SLUNNÁ - MORAVANY

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Obec Moravany**
se sídlem: Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany
bankovní spojení: Komerční banka Brno - venkov
číslo účtu: 6824641/0100
IČO: 00282120
DIČ: CZ00282120
zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Marií Barešovou, starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Oldřich Nezhyba, IČ: 61614807.

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/ 0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Davidem Dardou, ředitelem OZ MORAVA
zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Čížek, výrobní náměstek
Eva Štěpánová Blahošová, ved.OTO
vedený u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení zakázky na stavební práce: „**Oprava místní komunikace v ulici Slunná - Moravany**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
Provedení stavby s názvem: „Oprava místní komunikace v ulici Slunná - Moravany“ (dále jen „stavba“),
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. Dílo je způsobilé svému účelu užití, vykazuje-li veškeré technické, estetické a funkční vlastnosti definované zadáním stavby a může-li být bez omezení užíváno.
5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí oprava místní komunikace v ulici Slunná – Moravany.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem:
„Oprava místní komunikace v ulici Slunná - Moravany“,
vypracovaná Ing. Robertem Šimkem, Janouškova 3, 779 00 Olomouc v lednu 2018.
 - ii. písemné pokyny objednatele;
 - iii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
 - iv. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - i. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - ii. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění,
 - iii. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - iv. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - v. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - vi. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- vii. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

III. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

- | | |
|---|---|
| i. Předání a převzetí prostoru staveniště | nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele |
| ii. Dokončení a předání stavby | ve lhůtě do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště |
| ii. Předání a převzetí díla | do 15 dnů od dokončení stavby |

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště,
- iii. doklady stanovené touto smlouvou.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.

8. Alespoň 5 pracovních dnů předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará, nejpozději však při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím.

O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitel termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností, nestanoví-li objednatel jinak. Objednatel je oprávněn rozhodnout v průběhu provádění díla o prodloužení lhůt podle odst. 1 tohoto článku. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

CENA DÍLA

Cena díla:

Cena bez DPH	2 115 048,73 Kč
DPH	444 160,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 559 208,96 Kč

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu díla (dále jen Rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na vytvoření díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

Cena uvedená v sazebníku RTS, Brno, a.s.

Cena uvedená v sazebníku RTS Brno, a.s.

- ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Návrh změny bude vypracován formou změnového listu.
- iii. Bude-li návrh zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.
- iv. Obě strany následně změnu závazku ze smlouvy a změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- v. Veškeré změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:
 - i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - od začátku stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
6. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem objednatele,
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - i. výslovný název Konečná faktura,
 - ii. celkovou sjednanou cenu,
 - iii. soupis všech uhrazených faktur,
 - iv. částku zbývající k úhradě.
8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o dokončení stavby a protokoly o předání a převzetí díla.
9. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.
10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
13. Zálohové platby se nesjednávají.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

i. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

ii. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

iii. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDI pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x týdně. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- iv. doklady o likvidaci odpadu,
- v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.

6. Poddodavatelé

- i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

- ii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
- iii. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- i. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- ii. Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

- i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
- ii. vytyčit obvod prostoru staveniště,
- iii. zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- i. stanovení dočasného značení,
- ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,
- iii. povolení užívání veřejného prostranství a případně další.

6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenese odpovědnost za zařízení staveniště.

8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že:

- i. stavební práce na staveništi budou probíhat v pracovní dny a v soboty výhradně v době od 7:00 do 18:00 hodin, práce nesmějí probíhat v neděli a ve dnech státních svátků, nestanoví-li objednatel jinak;
- ii. veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. Majitelé přilehlých pozemků musejí být s dostatečným předstihem zhotovitelem upozorněni, že budou mít omezený přístup ke svým nemovitostem a musejí být včas vyzváni, aby odstranili svá vozidla;
- iii. příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny proti poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění nezpevněných ploch porušených stavbou).

IX. ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny závazku ze smlouvy, tedy změny zadání stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Ke změnám závazku ze smlouvy bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Změny závazku ze smlouvy lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

- i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či změn,
- ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
- iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
- iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
- v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
- vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
- vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podepsat potvrdit správnost soupisu provedených prací,
- viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,

- ix. činit zápisy do stavebního deníku.
- 4. Technický dozor je oprávněn
 - i. převzít od zhotovitele stavbu, řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - ii. udílet zhotoviteli pokyny,
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - iv. činit zápisy do stavebního deníku.
- 5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
- 6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- 7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

XI. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- 1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 5.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu objednatele předloží doklady o pojištění.
- 3. Odpovědnost za vady díla
 - i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
 - iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla jako jistotu za splnění povinností zhotovitele z odpovědnosti za vady díla
 - a) bankovní záruku za záruční lhůtu nebo
 - b) finanční zajištění formou složení peněžní částky na účet objednatele.

Jistota za splnění povinností zhotovitele při odpovědnosti za vady díla bude poskytnuta ve výši 5% z ceny díla dle této smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků. Pokud zhotovitel selže při odstraňování vad ve sjednané záruční lhůtě, využije objednatel plnění z jistoty z odpovědnosti za vady díla. Získá tak prostředky na odstranění vad případně jiným zhotovitelem.

5. Bankovní záruky budou vydány peněžním ústavem s příslušným oprávněním. Bankovní záruky budou neodvolatelné, bezpodmínečné a na první vyžádání. Uvedené bankovní záruky budou předloženy písemnou formou zástupcem zhotovitele uvedeným v záhlaví smlouvy oprávněnému zástupci objednatele, a to v sídle objednatele. Svá práva z uvedených bankovních záruk je

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se záruky zhotovitele týkají. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedené bankovní záruky poskytla, ke splnění jejich závazků z těchto bankovních záruk, přičemž ve výzvě uvede, výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která bankovní záruky poskytla, není oprávněna uplatňovat námitky vůči objednateli ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

6. Platnost bankovní záruky za záruční lhůtu bude do 15. dne po skončení záruční doby, sjednané v čl. XIII. odst. 7 i této smlouvy.

7. Záruka za jakost

- i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku. Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců
- ii. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- iii. Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

8. Smluvní pokuta

- i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1 15.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 15.000,- Kč denně

V případě provádění stavby v rozporu se zadáním stavby 15.000,- Kč pokaždé

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 3.000,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 20.000,- Kč za poddodavatele

- ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
- iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

9. Úrok z prodlení

- i. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

10. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel

převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2028. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství, s výjimkou jmenovitě uvedených dat, která zhotovitel označuje za citlivá, jimiž jsou ***.
2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i
 - i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
9. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace.
10. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Rozpočet (oceněný soupis prací),


- ii. Harmonogram,
 - iii. Oprávněné osoby objednatele,
 - iv. Oprávněné osoby zhotovitele.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
12. Tato Smlouva byla schválena na 72. zasedání Rady obce Moravany, konaném dne 3.4.2018, usnesení č. 42R/61/2018.

V Rajhradcích, dne 18.5.2018

V Moravanech, dne 22.5.2018

M. SELNICE s.s.
Hvozdova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
⑦ **oblastní závod MORAVA**
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA


RNDr. Marie Barešová
starostka



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018-001

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

JKSO:
Místo: Moravany

CC-CZ:
Datum: 5. 1. 2018

Objednatel:
Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

IČ: 00282120
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ: 73965952
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 115 048,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 115 048,73
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 115 048,73	444 160,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 559 208,96
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018-001

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Místo: Moravany

Datum: 5. 1. 2018

Objednatel: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškov

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 115 048,73	2 559 208,96
1	Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany	1 991 983,73	2 410 300,31
2	Vedlejší a ostatní náklady	123 065,00	148 908,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 115 048,73	2 559 208,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 1 - Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

JKSO:
Místo: Moravany

CC-CZ:
Datum: 5. 1. 2018

Objednatel:
Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

IČ: 00282120
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ: 73965952
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 991 983,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 991 983,73
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 991 983,73	418 316,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 410 300,31
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 1 - Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Místo: Moravany

Datum: 5. 1. 2018

Objednatel: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova :

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 991 983,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 991 983,73
1 - Zemní práce	308 023,91
4 - Vodorovné konstrukce	1 431,31
5 - Komunikace pozemní	1 037 291,11
8 - Trubní vedení	61 823,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	467 557,15
997 - Přesun sutě	106 041,76
998 - Přesun hmot	9 815,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 991 983,73

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 1 - Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Místo: Moravany

Datum: 5. 1. 2018

Objednatel: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškova :

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 991 983,73

HSV - Práce a dodávky HSV

1 991 983,73

1 - Zemní práce

308 023,91

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	285,261	45,00	12 836,75
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	31,580	31,00	978,98
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	30,950	50,00	1 547,50
4	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	3,430	93,00	318,99
5	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	85,691	203,00	17 395,27
6	K	113154333	Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 481,979	42,00	104 243,12
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	357,950	39,00	13 960,05
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	101,444	118,00	11 970,39
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,441	328,00	2 112,65
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,034	683,00	2 755,22
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	140,445	96,00	13 482,72
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	702,225	13,00	9 128,93
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	266,846	228,00	60 840,89
14	K	171-R-001	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení, složení a dovozu na místo stavby	m3	32,416	976,00	31 638,02
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,845	331,00	2 596,70
16	M	58337302R	šterkopisek frakce 0-16	t	16,082	355,00	5 709,11
17	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	324,160	28,00	9 076,48
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	324,160	14,00	4 538,24
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,725	120,00	1 167,00
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,749	21,00	960,73
21	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	10 859,00	119,45
22	M	251-R-001	Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník	kg	11,346	57,00	646,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

1 431,31

23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,680	873,00	593,64
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,265	3 161,00	837,67

5 - Komunikace pozemní

1 037 291,11

25	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	139,483	64,00	8 926,91
26	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	6,574	141,00	926,93
27	K	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	41,590	180,00	7 486,20
28	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	480,486	149,00	71 592,41
29	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	6,574	299,00	1 965,63
30	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	6,574	435,00	2 859,69
31	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6,574	82,00	539,07
32	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	4 851,554	14,00	67 921,76
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	2 431,124	161,00	391 410,96
34	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 420,430	189,00	457 461,27
35	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3,430	308,00	1 056,44
36	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	57,820	230,00	13 298,60
37	M	592-R3	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	46,385	246,00	11 410,71
38	M	592-R-03	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená	m2	1,468	296,00	434,53

8 - Trubní vedení

61 823,27

39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	5,670	359,00	2 035,53
40	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	1,000	148,00	148,00
41	M	286117220	<i>víčko kanalizace plastové KGK DN 160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>
42	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	228,00	456,00
43	M	286-R-334	<i>Dodatečná odbočka z PVC sedla DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 560,00</i>	<i>4 560,00</i>
44	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	4 949,00	9 898,00
45	M	592238-R1	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní v, 555 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,020</i>	<i>1 089,00</i>	<i>2 199,78</i>
46	M	592238-R2	<i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací v. 60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,020</i>	<i>1 165,00</i>	<i>2 353,30</i>
47	M	592238-R3	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC DN 150, v. 350 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,010</i>	<i>1 064,00</i>	<i>1 074,64</i>
48	M	592238-R4	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní v. 300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,020</i>	<i>1 051,00</i>	<i>2 123,02</i>
49	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	477,00	954,00
50	M	592238-R5	<i>litinová mříž se zabetonovaným rámem a nálevkou D400 v. 160 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 175,00</i>	<i>8 350,00</i>
51	M	592238-R6	<i>ocelový žárově zinkovaný bahenní koš prům. 385 mm, v. 250 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>912,00</i>	<i>1 824,00</i>
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000	1 571,00	21 994,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	628,00	3 768,00

- Ostatní konstrukce a práce, bourání 467 557,15

116111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	694,780	225,00	156 325,50
183801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	17,543	4 433,00	77 768,12
116131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	302,340	300,00	90 702,00
192-R-003	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	239,814	117,00	28 058,24
192-R-004	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	57,469	95,00	5 459,56
192174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	8,080	228,00	1 842,24
116231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,350	322,00	13 314,70
192174170	obrubník betonový chodnikový Standard 100x10x25 cm	kus	41,764	99,00	4 134,64
11678-R1	Montáž zpomalovacího plastového prahu	m	5,500	741,00	4 075,50
116991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,047	2 555,00	15 450,09
119732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	60,760	77,00	4 678,52
119735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	409,340	94,00	38 477,96
138908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 420,430	6,00	14 522,58
166006261	Odstanění zpomalovacího plastového prahu	m	5,500	245,00	1 347,50
166-R-001	Vybourání uličních vpustí	kus	1,000	11 400,00	11 400,00

17 - Přesun sutě 106 041,76

197221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	432,097	14,00	6 049,36
197221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 049,358	6,00	36 296,15
197221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	87,326	228,00	19 910,33
197221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	344,771	127,00	43 785,92

18 - Přesun hmot 9 815,22

198225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	218,116	45,00	9 815,22
-----------	---	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Moravany

CC-CZ:

Datum: 5. 1. 2018

Objednatel:

Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

IČ: 00282120

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova 3, 779 00 Olomouc

IČ: 73965952

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				123 065,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				123 065,00
DPH základní	21,00%	ze	123 065,00	25 843,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	148 908,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravany

Datum:

5. 1. 2018

Objednatel: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Projektant:

Ing. Robert Šimek, Janouškova :

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	123 065,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 000,00
ON - Ostatní náklady	19 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 065,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	72 266,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 133,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 666,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 065,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravany

Datum: 5. 1. 2018

Objednatel: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany

Projektant: Ing. Robert Šimek, Janouškova :

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 065,00

HSV - Práce a dodávky HSV

19 000,00

ON - Ostatní náklady

19 000,00

1	K	0010001R	Provizorní a přechodná dopravní zařízení	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00
---	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 065,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

72 266,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	21 600,00	21 600,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	31 666,00	31 666,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 133,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 133,00	10 133,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

21 666,00

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00
7	K	045-R01	Publilita projektu	Kč	1,000	12 666,00	12 666,00

ČASOVÝ A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

stavba: Oprava místní komunikace v ul. Slunná - Moravany


Doba realizace

60 dní

Investor:

obec Moravany

Rok	2018	
Měsíc	1	2
Zemní práce		
Vodorovná konstrukce		
Komunikace pozemní		
Trubní vedení		
Ostatní konstrukce a práce, bourání		
Přesun sutě		
Přesun hmot		
Vedlejší a ostatní náklady	662 695	1 452 353

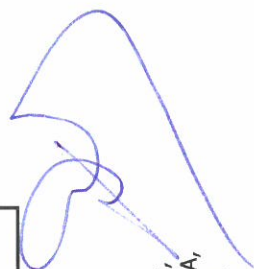

Ing. David Darda,
ředitel OZ MORAVA,
M - SILNICE a.s.

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Oldřich Nezhyba, IČ: 61614807

SPRÁVCE STAVBY

RNDr. Marie Benešová

